

10/6.1 НАСЛОВНА СТРАНА

10. ПРОЈЕКАТ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКТА

Инвеститор:	„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. Немањина 6/4, Београд
Наручилац:	Конзорцијум фирми: China Railway International Corporation Ltd. China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
Објекат:	Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) , у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци
Врста техничке документације:	ПГД- Пројекат за грађевинску дозволу
Назив и ознака дела пројекта:	ПРОЈЕКАТ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКТА 10/6 Пројекат рушења надвожњака на км 131+245.45
За грађење / извођење радова:	Нова градња
Пројектант:	China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166 11000 Београд, Србија
Одговорно лице пројектанта:	Генерални директор: 耿欣 (Генг Ксин) 
Потпис:	 XIN GENG Digitally signed by XIN GENG Date: 2021.08.03 10:32:52 +02'00'
Одговорни пројектант:	Зоран Луковић, дипл. грађ. инж. Лиценца број: 310 3032 03
Потпис:	 ЗОРАН ЛУКОВИЋ 011041396 Sign Digitally signed by ЗОРАН ЛУКОВИЋ 011041396 Sign Date: 2021.08.01 07:13:21 +02'00'
Број дела пројекта:	2020-001-ГС-10/6
Место и датум:	Београд, април 2021.год.

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

10/6 ПРОЈЕКАТ РУШЕЊА НАДВОЖЊАКА НА km 131+245.45

Објекта: Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци, на основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон, 9/20 и 52/21) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019), извршена је техничка контрола предметне документације, од стране предузећа CESTRA d.o.o. Београд.

ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА

Вршилац техничке контроле:

CESTRA d.o.o,
Макензијева 57, Београд

Број лиценце:

351-02-03374/2020-09 од 18.03.2021.

Одговорно лице/Заступник:

Директор:
Драган Милић, дипл.грађ.инж.

Потпис:

	Dragan Milić Digitally signed by Dragan Milić Date: 2021.08.03 15:11:32 +02'00'
---	--

Вршилац техничке контроле:

Немања Шеловић дипл.грађ.инж.

Број лиценце:

310 P214 17

Потпис:

	Nemanja Šelović Digitally signed by Nemanja Šelović Date: 2021.08.03 14:52:25 +02'00'
---	--

Број техничке документације:

A10312-61/21

Место и датум:

Београд, 2021.

10/6.2 САДРЖАЈ

10/6.1	Насловна страна
10/6.2	Садржај
10/6.3	Решење о одређивању одговорног пројектанта
10/6.4	Изјава одговорног пројектанта
10/6.5	Текстуална документација
10/6.5.1	Технички опис
10/6.6	Нумеричка документација
10/6.6.1	Предмер и предрачун радова
10/6.7	Графичка документација
10/6.8	Фото документација

10/6.3 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу Члана 128, Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.закон и 9/2020 и 52/2021) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

за израду **ПРОЈЕКАТ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКТА – 10/6 Пројекат рушења надвожњака на км 131+245.45**, који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци, одређује се:

Зоран Луковић, дипл.грађ.инж. _____ 310 3032 03

Пројектант: CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION SERBIA
OGRANAK BEOGRAD, Косте Рацина 166

Одговорно лице/заступник: Генерални директор: Генг Ксин, дипл.инж.

Потпис:



Број техничке документације: 2020-001-ГС-10/6

Место и датум: Београд, април 2021.год.

10/6.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

Одговорни пројектант пројекта **ПРОЈЕКАТ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКТА - 10/6 Пројекат рушења надвожњака на км 131+245.45**, који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци:

Зоран Луковић, дипл. грађ.инж.

ИЗЈАВЉУЈЕМ

1. да је пројекат у свему у складу са издатим Локацијским условима:

-бр.ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020,

-бр.ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 07.04.2020 - Решење о исправци грешке,

-бр.ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, Заводни број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020,

-бр.ROP-MSGI-931-LOC-3/2020, Заводни број: 350-02-00192/2020-14 од 29.05.2020;

2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

3. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама.

Одговорни пројектант: Зоран Луковић, дипл. грађ. инж.
Број лиценце: 310 3032 03

Потпис:



Број техничке документације: 2020-001-ГС-10/6
Место и датум: Београд, април 2021.год.

10/6.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

10/6.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Постојећи друмски надвожњак се налази у месту Мали Иђош и испод њега пролази траса једноколосечне пруге Нови Сад – Суботица. Због пројектовања нове трасе двоколосечне пруге Нови Сад – Суботица, постојећи надвожњак се уклања и гради се нови друмски надвожњак на стационажи пруге на km 131+245,45, десног колосека.

ОПШТА ПРАВИЛА

Пре почетка свих радова инвеститор подноси захтев за издавање дозволе за уклањање мостова надлежним службама Општине на којој се врши уклањање објекта. Уз захтев за издавање дозволе за уклањање мостова подноси се:

- 1- пројекат уклањања са техничком контролом
- 2- доказ о власништву над мостом
- 3- копија плана са уцртаним мостовима
- 4- посебни услови ако се ради о мосту чије рушење угрожава јавни интерес: заштита постојеће комуналне инфраструктуре, заштита животне средине.

ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА: Инвеститор је дужан да извођачу преда мостове искључене из комуналних мрежа што се пре почетка радова записнички потврђује. Надземни и подземни водови у непосредној зони извођења радова морају бити видно обележени, безбедно заштићени или измештени. Инвеститор је дужан да извођачу обезбеди прикључке на водоводну и електро мрежу, да обезбеди сагласност о заузећу дела јавних површина. Инвеститор, по потреби, на захтев извођача мора да обезбеди присуство одговорног лица из комуналног предузећа које ће упутити извођача на могуће присуство инсталација.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА: Да докаже стручност, квалификације својих радника и њихову обуку из заштите на раду, да достави списак алата и расположивих машина за рушење мостова. Извођач има право да прода материјале и елементе за рушење који се могу рециклирати трећим лицима, али то се не може учинити на градилишту, већ са локације коју је уговарач формирао у ту сврху. Материјал са моста треба уклонити чим се изврши рушење, а положај привремених депонија дат је на градилишту. Уређење земљишта након рушења (насипање земљишта на месту срушеног објекта) може бити предмет договора између инвеститора и извођача пре почетка радова и у складу са потребама смањења трошкова изградње.

Приликом уклањања мостова извођач је обавезан да се придржава:

- Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова (53/97)
- Закон о безбедности и здрављу на раду (101/05)
- Закон о заштити од пожара (111/09;20/15)
- Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и истовару терета из таквих возила (42/91)
- Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада (92/10)

ОПИС ПЛАНИРАНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ УКЛАЊАЊА НАДВОЖЊАКА

Овим пројектом се дефинише начин рушења постојећих мостова. Рушење објекта се може вршити ручно, помоћу машина или минирањем. Како су у питању околна насеља и близине других објеката која су у функцији око мостова, изабрано је машинско и ручно рушење мостова. Рушење мостова ће се извршавати у фазама.

1. Први корак је ограђивање металном нетранспаретном оградом и видно обележавање простора на коме се спроводи уклањање.
2. Други корак је предузимање мера на смањење загађења при уклањању
3. Спровођење мера заштите суседних објеката – све време
4. Грађевински и други отпадни материјал који може настати у току уклањања објекта прописно се разврста и транспортује у складу са законом
5. По завршеном уклањању објекта мора се извршити уређење земљишта и одвоз грађевинског отпада у складу са посебним прописима и извођач је дужан да изравна терен и околину доведе у уредно стање.

ЗАШТИТА ЛИЦА КОЈА РАДЕ НА УКЛАЊАЊУ ОБЈЕКТА

Пре почетка рушења мостова мора се угрожено подручје оградити заштитном металном оградом и видно обележити простор на коме се спроводи уклањање и рушење. Постављају се видљиве табле са натписом: Забрањен улаз неовлашћеним лицима и табле: забране, обавештења и упозорења о радовима и о забрани уласка. Обавезан је чувар на градилишту у циљу заштите простора за време радних и нерадних сати. Заштита подручја мора трајати до комплетног завршетка свих радова.

Лица која раде на рушењу морају да буду практично оспособљена за рад и да имају адекватну опрему. Сваки радник мора да носи лична заштитна средства: радно одело, заштитни шлем, заштитне наочари, кожане рукавице, заштитне ципеле, опасач за рад на висини и др. по потреби. За све особе које се нађу на градилишту такође је прописана обавеза коришћења радне и заштитне опреме.

Припрема рушења и уклањање делова и материјала срушеног моста изводи се уз стални надзор одговорног стручног радника и представника ЈП због заштите инсталација.

На градилишту мора бити организована прва помоћ: прибор у ормарићу, носила, возило за транспорт.

На градилишту морају постојати средства противпожарне заштите: бурад са песком, бурад са водом, хидранти, апарати за гашење пожара.

На основу посета мостовима немамо сазнања да ли на мостовима има опасних и штетних материјала за уклањање, али уколико би их у току радова пронашли, извођач треба са обавести Инвеститора и приступи по Закону о управљању отпадом и Закону о безбедности и здрављу на раду.

АЛАТИ И МАШИНЕ ЗА УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА

Рушење треба да си изводи алатима и машинама које су за то намењене. У ситуацији када је близу стамбена зграда, саобраћајница или неки други објект који се користи, не сме да се разбија и руши него да се сече посебним машинама и демонтира крановима и дизалицама и спушта у камион или плато приколицу. Ово је препорука-попис алата и машина за ефикасније извођење радова:

1. Багер гусеничар различитог дохвата
2. Хидраулични алати – пројектовани и произведени за рушење
3. Хидрауличне маказе и чекићи (сечење бетонске конструкције)
4. Клешта за рушење
5. Мини машине су погодне када је ограничен простор (мини багери)
6. Одговарајуће дизалице и чекрци за спуштање отпада
7. Трактор гусеничар, забрањено је користити трактор са точковима
8. Специјални контејнери за складиштење и одвоз отпада
9. Камioni и специјалне приколице за транспорт делова
10. Пловеће транспортне машине и барже

ТЕХНОЛОГИЈА УКЛАЊАЊА И ДЕМОНТАЖЕ ПОСТОЈЕЋЕГ НАДВОЖЊАКА ПО ФАЗАМА

На основу анализе доступне техничке документације (цртежи из идејног пројекта ЦИПа) и обиласка локације, предвиђено је да се уклањање конструкције надвожњака врши по фазама. Рушење конструкције се одвија у тоталном затвору железничког и друмског саобраћаја.

Постојећи објект је статичког система континуални носач на три поља (11.66+12.0+11.02m) са средњим стубовима који су преко Freyssinet зглобова повезани са главним носачима. У попречном правцу подвожњак је формиран од монтажних АБ носача висине. Попречни пресек конструкције висине 0.80m, ширине око 7,80m.

ФАЗА I

У првој фази предвиђено је да се изврши постављање конструкција челичних јармова око стубова за ојачање стубова и пријем утицаја које се јављају у стубовима на основу промена статичког система услед рушења (шема дата у цртежу). Такође је предвиђено уклањање асфалта, парапетних венаца, железничких прагова, пешачких стаза са обе стране моста, заштитне ограде као и пешачке ограде целом дужином моста.

ФАЗА II

У другој фази предвиђено је уклањање главних носача конструкције у средњем пољу надвожњака (С2-С3). Пре почека демонтаже конструкције врши се постављање конструкција челичних јармова за пријем утицаја од елемената током уклањања конструкције. Уклањање конструкције у фази II предвиђено је да се врши у 8 корака. Сваки корак обухвата сечење елемента конструкције дужине 9,50m и ширине око 0,95m (ширина средњих монтажних носача) док су крајњи монтажни носачи ширине од око 0,85m сваки висине од 0,8m, тако да је тежина сваког комада око 19 тоне. Приликом сечења, елементи се привремено ослањају на конструкције челичних јармова, док се не изврши качење за дизалицу помоћу сајли. Након качења, врши се утовар елемента у камион, а затим се врши транспорт датог елемента на локацију коју је одредио надзорни орган.

ФАЗА III

У трећој фази се приступа уклањању дела главних носача конструкције изнад средњих стубова С2 и С3. Прилаз зони за рад у овој фази уклањања врши ће се преко постојеће конструкције крајњих главних носача.

ФАЗА IV

У овој фази се приступа уклањању главних носача конструкције у крајњим пољима надвожњака по приказаној шеми. Приступа се сечењу и уклањању једног дела главног носача дужине од око 10,0m. Даљи поступак је у свему исти као у фази II овог пројекта.

ФАЗА V

У овој фази се приступа уклањању стубова C2 и C3 као и лежшних греда на самим средњим стубовима машински и ручно са механизацијом и алатом предвиђеним за ту врсту радова.

ФАЗА VI

У шестој фази се приступа уклањању обалних стубова, наглавних греда, темеља, итд... Материјали се утоварују у камионе и одвозе на депонију коју је одредио Надзорни орган. Након рушења, цео терен се доводи у пројектовано стање за изградњу новог моста.

МЕРЕ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂЕЊА ОКОЛНИХ ОБЈЕКТА И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Како су у питању насеља у близини неких мостова као и саобраћајнице у функцији, градилишта где се одвија рушење морају бити прописно ограђена градилишном оградом. На градилишту мора бити присутан чувар, а капија се у нерадне сате закључава. Радови на уклањању могу да се изводе до 17h у складу са Одлуком о кућном реду града на који се дати мост налази. Потребно је обавестити локално становништво о свим активностима које ће довести до евентуалне блокаде саобраћаја, повећања нивоа буке као и активностима које ће довести до појаве прашине. Мере које треба предузети на смањењу загађења околине при уклањању моста:

- Постављање заштитног платна према постојећим објектима
- По потреби стварање водене завесе шмрком са одговарајућим млазницама, стално поливање шута.
- На локацији је забрањено било какво паљење отпада (папира, пластике, дрвета...)

МЕРЕ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРОЛАЗНИКА И САОБРАЋАЈА

Градилиште мора бити прописно ограђено металном нетраспарентном оградом. Улаз у градилиште је контролисан и забрањен је улаз лица која ту нису запослена. Камioni за одвоз шута морају бити прописно натоварени, морају испуњавати услове за излаз на јавну саобраћајницу, возило мора бити прописно натоварено а точкови опрани. Транспортне руте морају бити дефинисане пре почетка радова на рушењу и извођач их се мора придржавати. Транспортна рута мора бити дефинисана тако да се обезбеди несметан пролаз пловних објеката који су битни за одржавање канала и река, несметана комуникација служби за хитне интервенције, да се избегну осетљиви садржаји: објекти образовања, дечије заштите, здравствене установе...

У свакој фази уклањања моста, потребно је регулисати несметану комуникацију пловила и возила као и регулисати пешачки и колски саобраћај према условима

саобраћајне полиције. Заштита пешака се обезбеђује постављањем градилишне оgrade и табле упозорења са потребним натписима.

Ако је потребно техничко регулисање саобраћаја у појединим сатима или данима због појачаног изласка-уласка у улицу која је доста фреквентна, прибавити услове од надлежних служби.

Треба поставити прописану сигнализацију и знакове забране, обавештења и упозорења у складу са пројектом регулације саобраћаја.

По извршеном уклањању надвожњака, извођач радова је дужан да изравна терени околину доведе у уредно стање, а сва оштећења која су настала у току рушења на јавној површини или комуналној инфраструктури отклони.

ОПИС НАЧИНА ИСКЉУЧЕЊА ОБЈЕКТА КОЈИ СЕ УКЛАЊАЈУ СА МРЕЖЕ КОМУНАЛНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Опис начина искључења, уклањања и премошћавања појединих инсталација као и сви извођачки радови у вези инсталација су у потпуности у надлежности и под контролом Јавних предузећа: Железнице Србије, Електродистрибуција, Топлана, Водовод, МУП, Пошта Србије, НИС.

Инвеститор је дужан да обезбеди надзор током рушења објекта, а по потреби или на захтев извођача, обезбеди присуство одговорног лица из комуналног предузећа које ће упутити извођача на могуће присуство инсталација.

Одговорни пројектант:



Зоран Луковић,
дипл.инж.грађ.

Бр. лиценце 310 3032 03

10/6.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

10/6.6.1 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ
ПРУГА: БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (Келебија)
КЊИГА 10/6 ПРОЈЕКАТ РУШЕЊА МОСТОВА
надвожњак на km 131+245.45
Мали Иђош

Бр. поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (дин)	Цена (дин)
			A	B	A*B
10/6-1	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ				
	ОПШТИ И ЗАЈЕДНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРИПРЕМНЕ И ПРЕТХОДНЕ РАДОВЕ				
	Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки сав рад и материјал који је потребан за комплетан и квалитетан завршетак радова описане позиције. ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују нормативи и стандарди рада у грађевинарству.				
10/6-1.1	Припрема градилишта.	пауш			200,000
10/6-1.2	Монтажа челичних јармова	м3	1,000.00	1400	1,500,000
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:					1,700,000
10/6-2	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ				
10/6-2.1	Широки ископ са утоваром, транспортом на депонију до 5km, као и са истоваром и планирањем материјала на депонији или месту уградње. Обрачун се врши по м3 ископаног материјала. - у материјалу I и II категорије - у материјалу III категорије - у материјалу IV и V категорије - у материјалу VI и VII категорије	м3 м3 м3 м3	0 312.0 0 0	320 340 860 1,400	0 106,080 0 0
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:					106,080
10/6-3	УКЛАЊАЊЕ КОНСТРУКЦИЈЕ				
	За све позиције наведених радова важи: * у цену је урачуната набавка свог потребног материјала, алата, механизације, транспорт, израда и монтажа према пројекту, а за комплетно завршен посао				
10/6-3.1	Рушење постојеће конструкције Рушење и уклањање горњег строја конструкције - застора,прагова, пешачке и заштитне ограде, главних и попречних носача, рушење парапета, лежишних гред, стубова и крила постојећих стубова, наглавних греда, темеља, темељних и стубних зидова од камена и бетона до пројектоване коте. у цену позиције улази и утовар са транспортом и одлагањем срушеног материјала на депонију до 5000м дањине. Обрачунава се по м2 основе моста.	м2	316	55,000	17,380,000.00
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:					17,380,000

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
10/6-1	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	1,700,000
10/6-2	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	106,080
10/6-3	УКЛАЊАЊЕ КОНСТРУКЦИЈЕ	17,380,000
	МЕЋУЗБИР	19,186,080
УКУПНО (дин):		19,186,080

Београд, април 2021. год.


Одговорни пројектант:

Зоран Луковић


Зоран Луковић, дипл.инж. грађ.
лиценца бр. 310 3032 03

10/6.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА


ПОДУЖНИ ПРЕСЕК НАДВОЖЊАКА LONGITUDINAL SECTION 1:100
ФАЗА I - Уклањање ограда, асфалта, шина и прагова - горњег строја

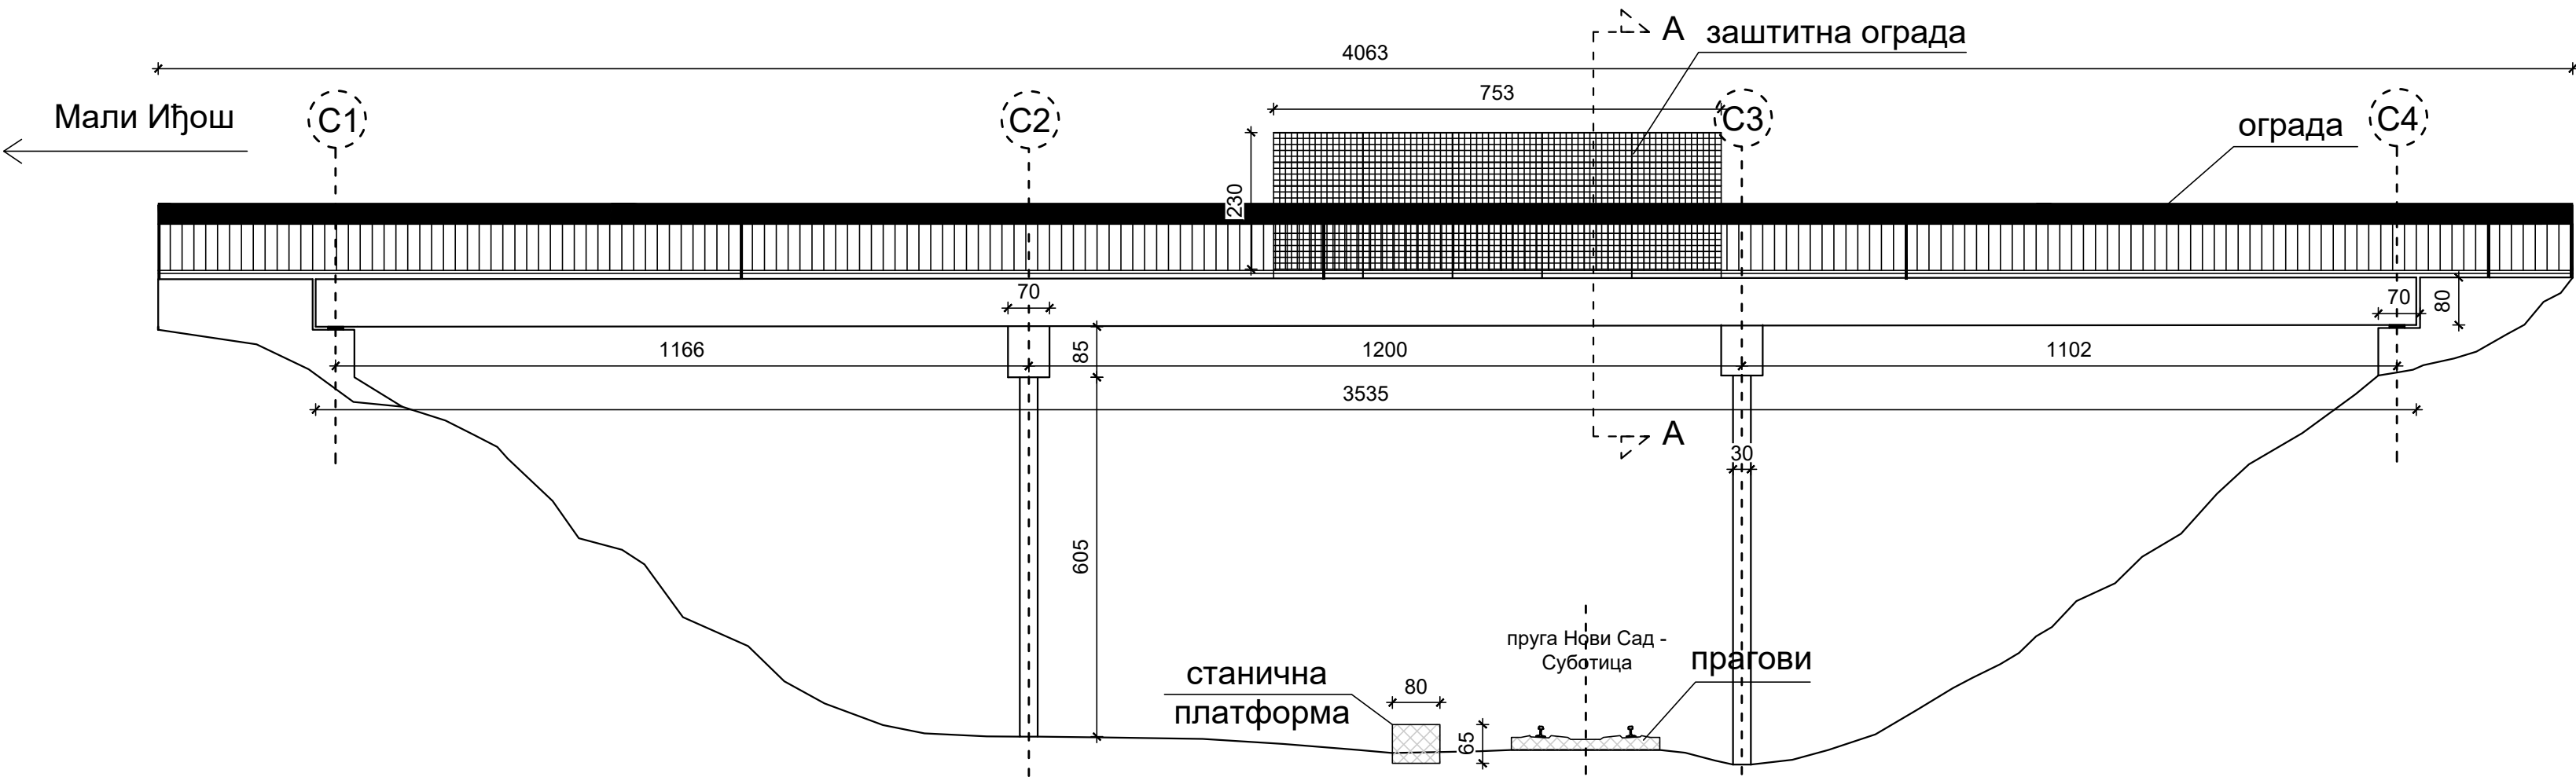

ОСНОВА НАДВОЖЊАКА 1:100 LAYOUT PLAN

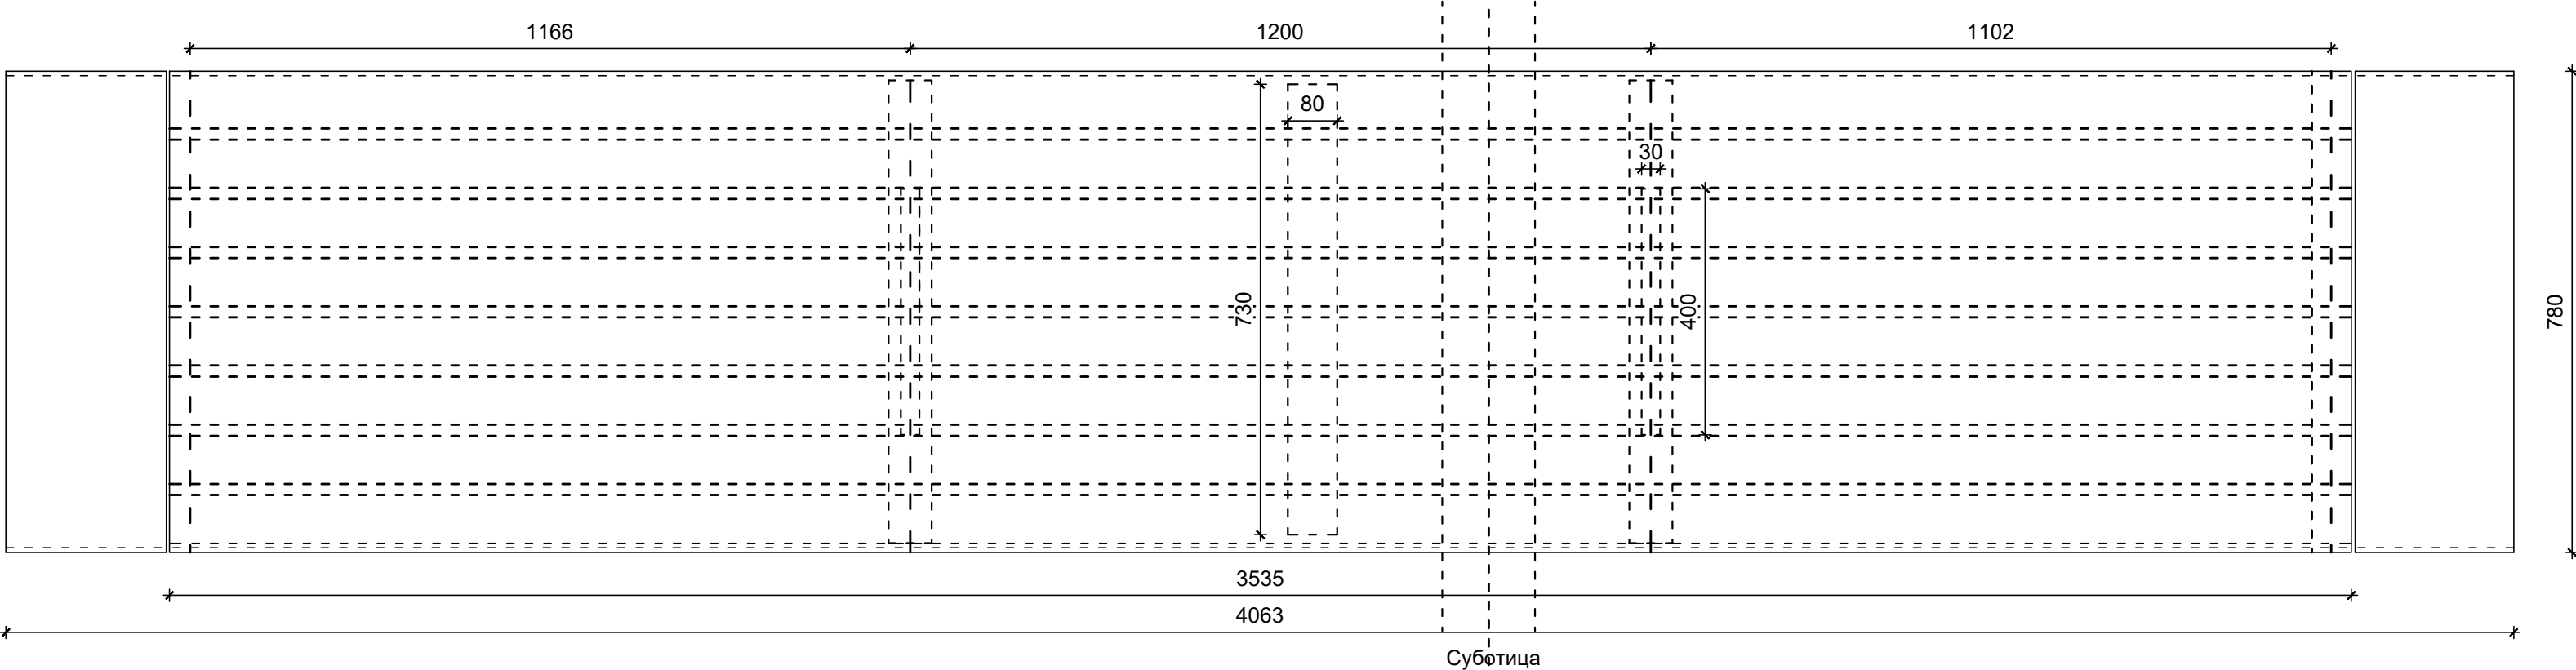

ПРЕСЕК А-А SECTION 1:100

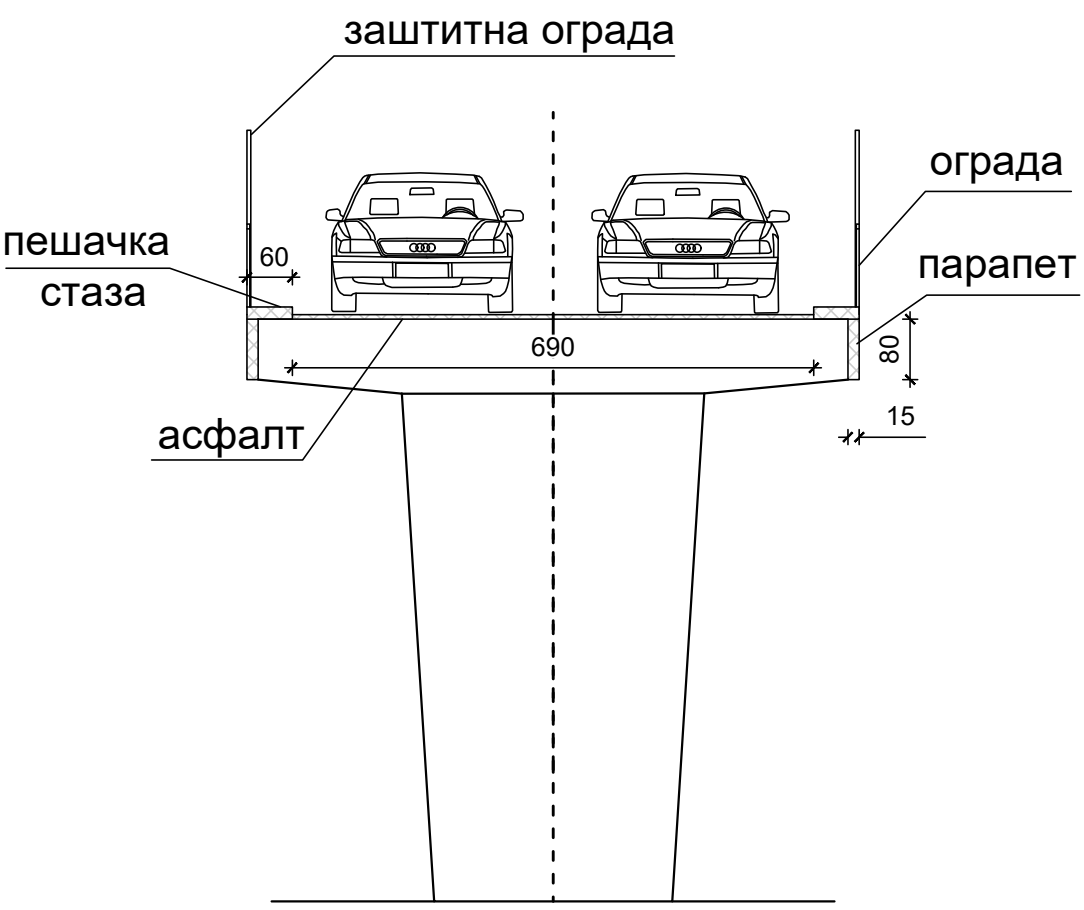

03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description

Ревизиони блок: / Revision block:

中国铁设

CRDC

China Railway Design Corporation Serbia


Ogranak Beograd

Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION


Одговорни пројектант: Responsible designer: Зоран Луковић, дипл. грађ. инж. лиценца број: / license No.: 310 3032 03	Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. / "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Немањина 8/IV, Београд / Nemanjina Street 8/IV, Beograd Наручилац пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD. No.10 Fuxing Road/Haidian District/Beijing P.R.China, 100844 China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street/Xicheng District/Beijing P.R.China, 100088
Сарадници: / Associates:	Објекат: /Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКТА / DESIGN OF REMOVAL OBJECT 10/6 Пројекат рушења надвожњака на км 131+245.45 10/6 Demolition Design for Overpass at km 131+245.45
Унутрашња контрола: / Internal control: Hou Jieping, Master & Shi Wei, Bachelor	Цртеж: / Drawing: ОСНОВА - ФАЗА I LAYOUT PLAN - PHASE I
Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.	Размера: Scale: 1:100
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.	Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP
	датум/date: 04.2021.
	Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-Г-С-10/6.7.01.

ПОДУЖНИ ПРЕСЕК LONGITUDINAL SECTION 1:100
 ФАЗА II Уклањање главних носача - C2-C3

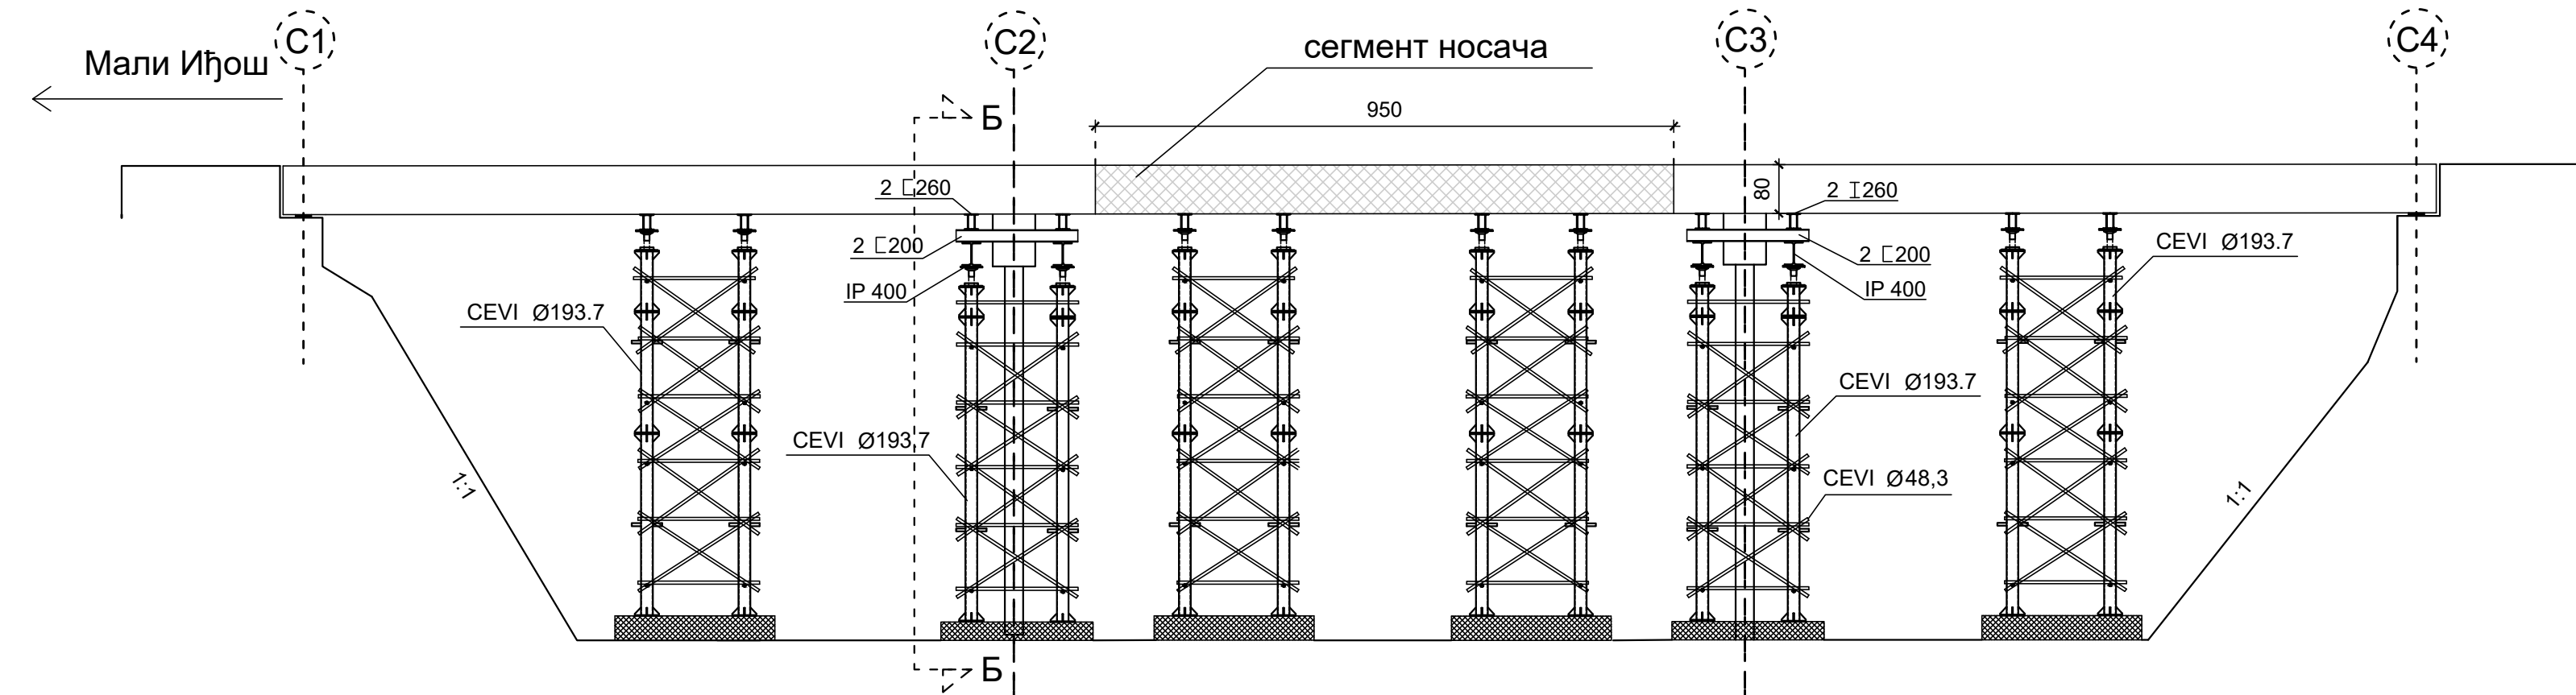


ОСНОВА НАДВОЖЊАКА 1:100 LAYOUT PLAN

Основа челичних торњева - јармова

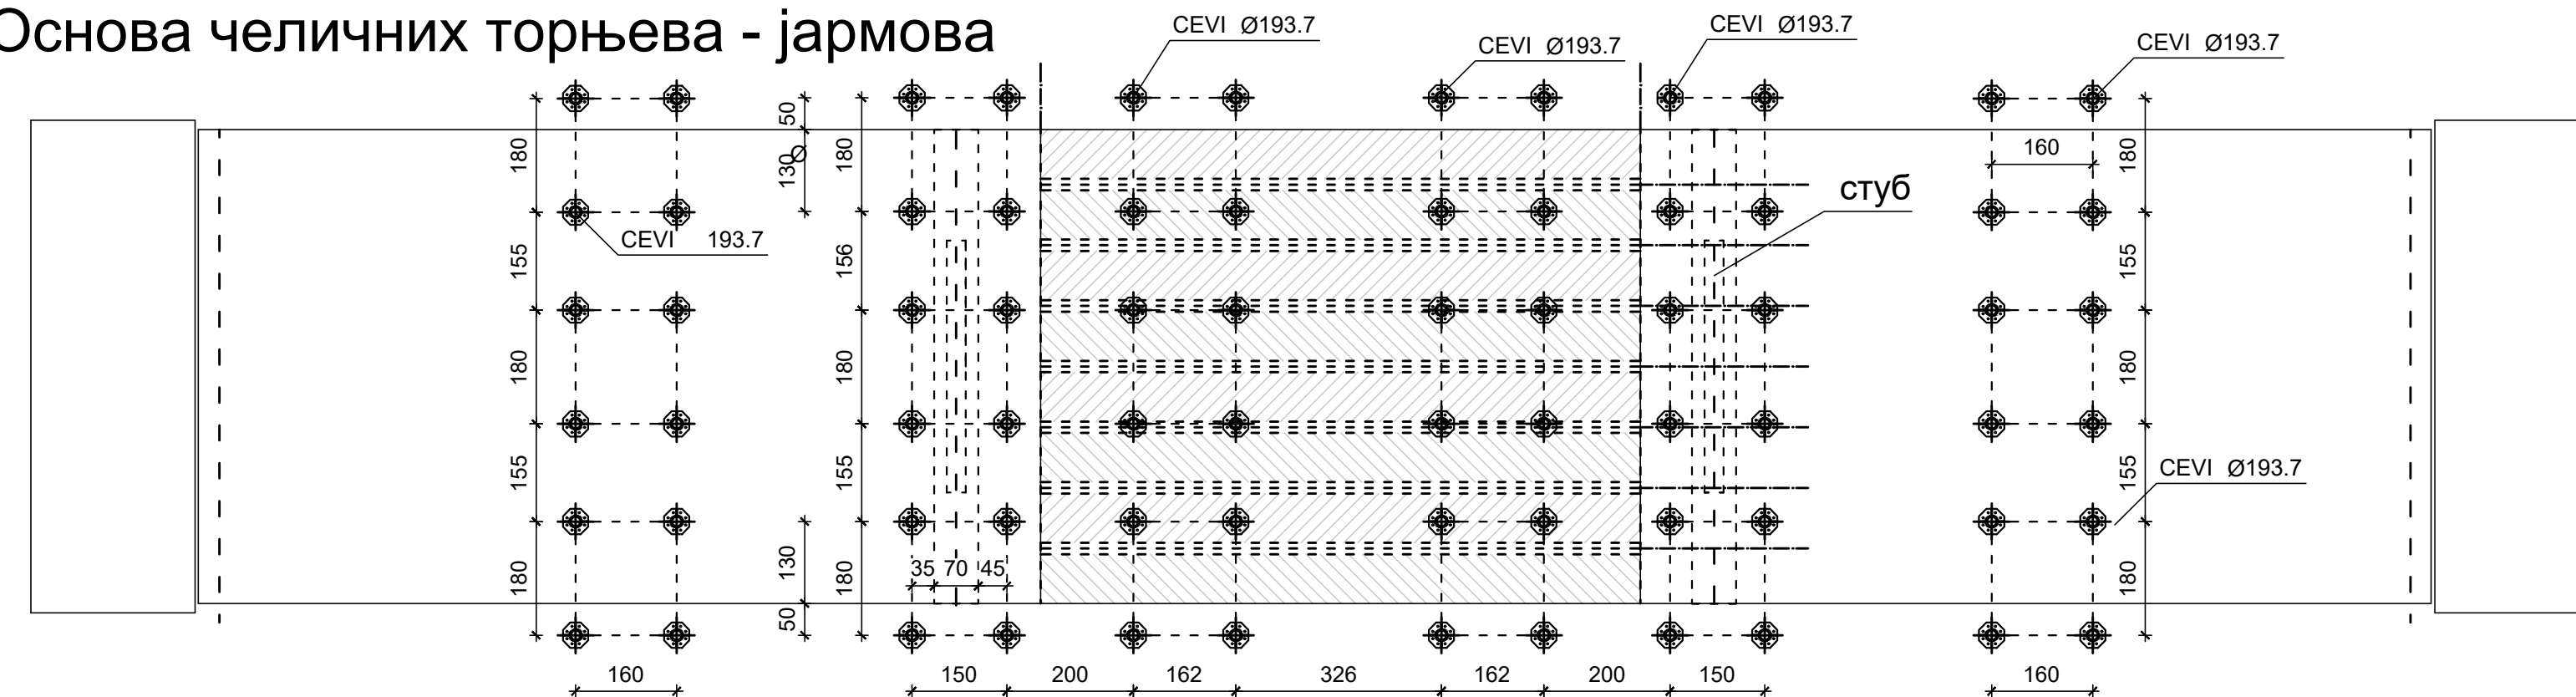


ОСНОВА НАДВОЖЊАКА 1:100 LAYOUT PLAN

Основа челичних носача

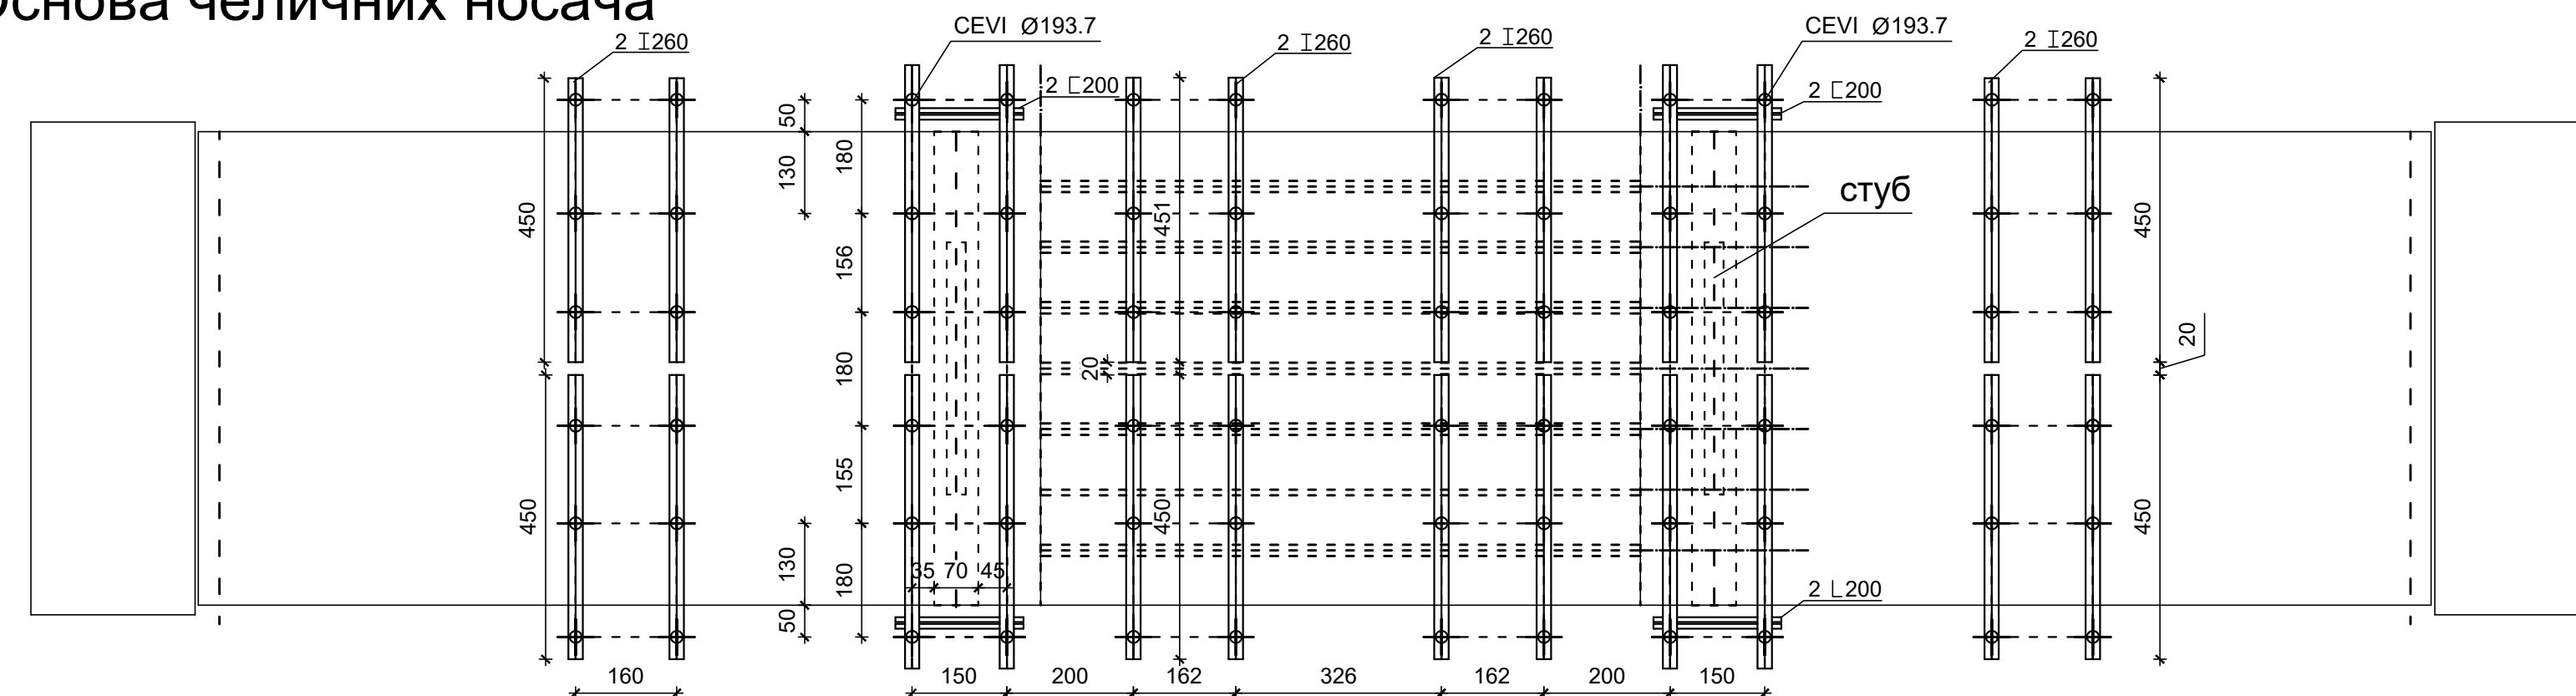


ПРЕСЕК Б-Б SECTION 1:100

УКЛАЊАЊЕ ГЛАВНИХ НОСАЧА

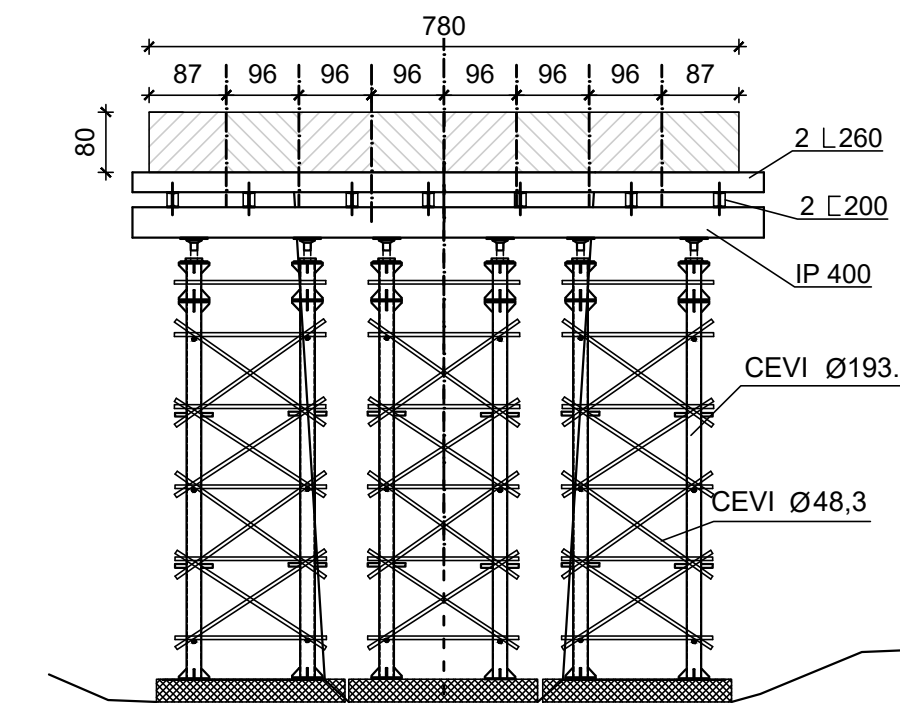


03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони број: / Revision block:		
 中国铁路 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166, 11000 Београд, Србија		
Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Зоран Луковић, дипл.грађиник лиценца БР / license No.: 310 3032 03		
Сарадници: / Associates:		
 Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈА" А.Д. "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Београдска 83/2, Београд - Немањина Street 83/2, Beograd  Наручилац пројекта: / Employer: 中國鐵路國際有限公司 CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CORPORATION LTD. No.10 Fuxing Road, Haidian District, Beijing P.R.China, 100088		
 China Construction Corporation Limited (CCCC) No.88 Dongfangmen Street, Xicheng District, Beijing P.R.China, 100088 Објекат: /Structure: ПУТА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕКЛАНА ПУТЕ ЖУВНИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)		
Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ УЛАЖАЊА ОБЈЕКТА / DESIGN OF REMOVAL OBJECT 10/6 Прометни рашења надомећа на km 131+245.45 10/6 Demolition design for Overpass at km 131+245.45		
Унутрашња контрола: / Internal control: Hou Jieping, Master & Shi Wei, Bachelor Цртеж: / Drawing: ОСНОВА - ФАЗА II LAYOUT PLAN - PHASE II		
Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађиник. Резерва: / Reserve: Scale: 1:100		
Руководилац организационе јединице: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађиник. Врста тек. док.: / Type of tech. docum.: ПДГ / DCP		
Датум издања: / Issue date: 04.2021. Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-Г-СР-016.7.02.		

ПОДУЖНИ ПРЕСЕК LONGITUDINAL SECTION 1:100
ФАЗА III - Уклањање делова носача изнад ослонаца C2 и C3

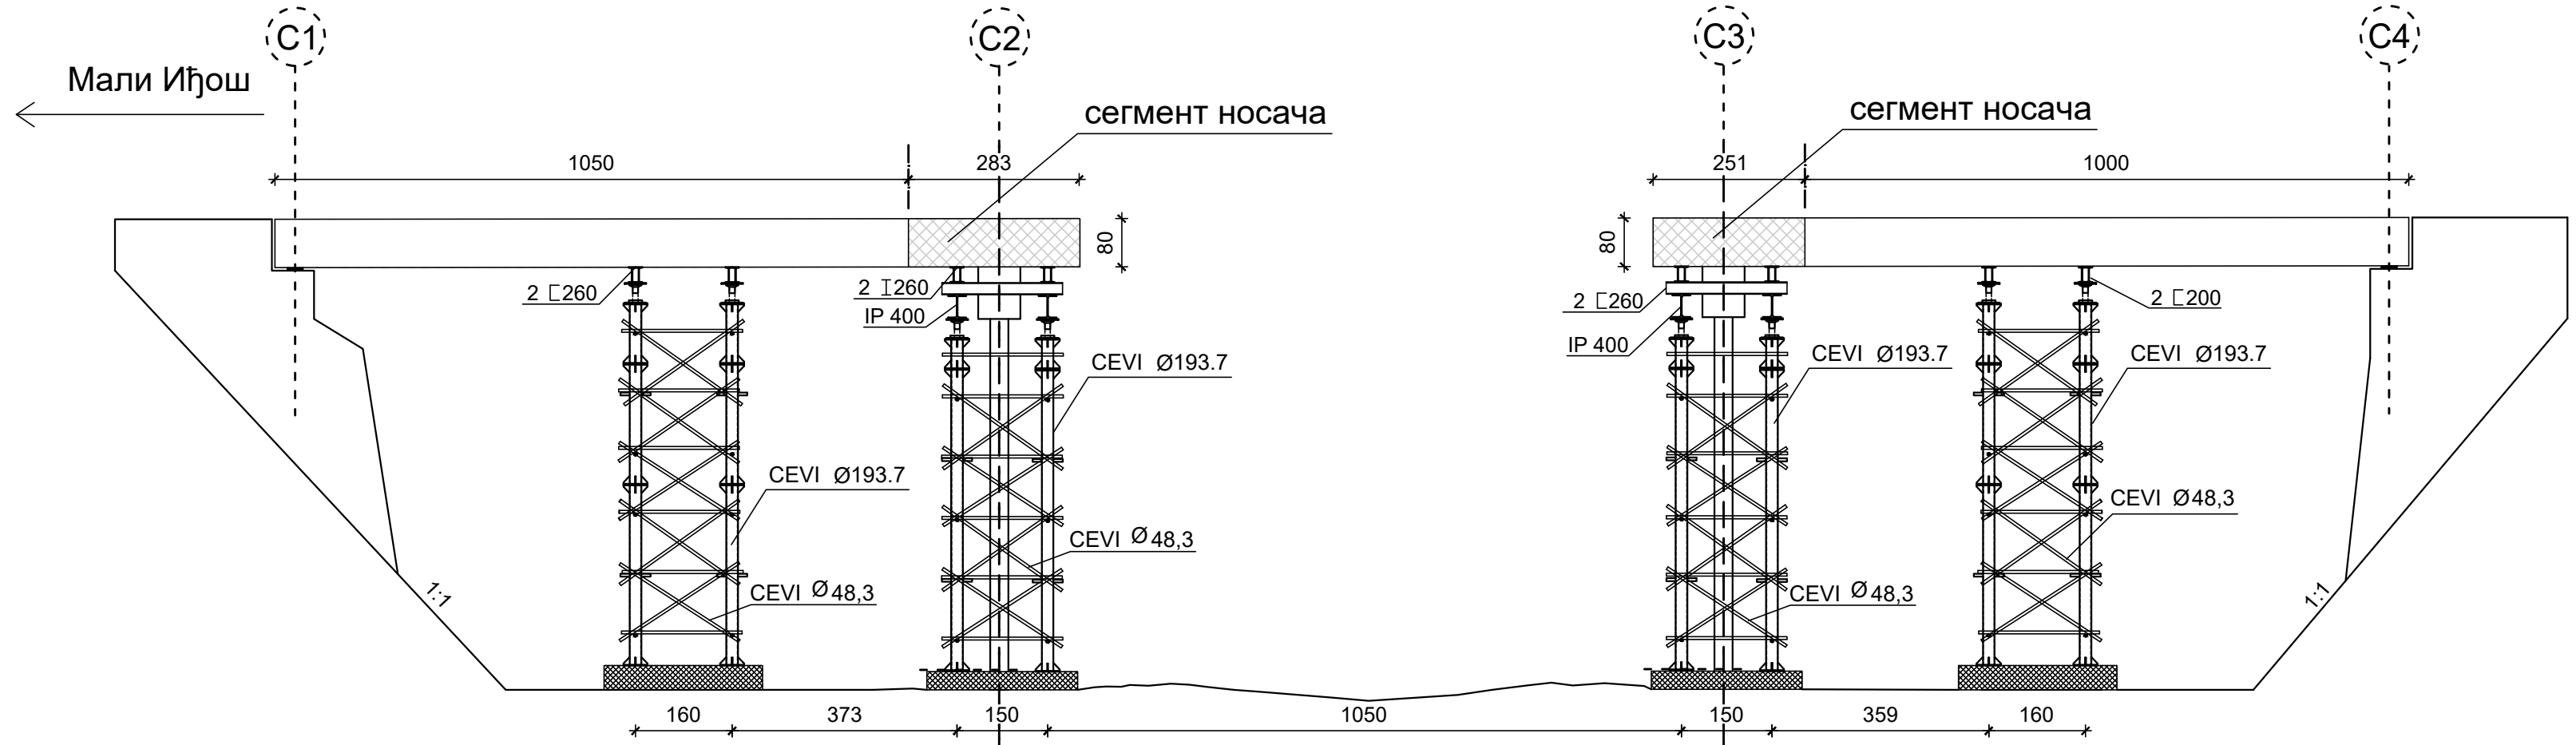


ОСНОВА НАДВОЖЊАКА 1:200 LAYOUT PLAN

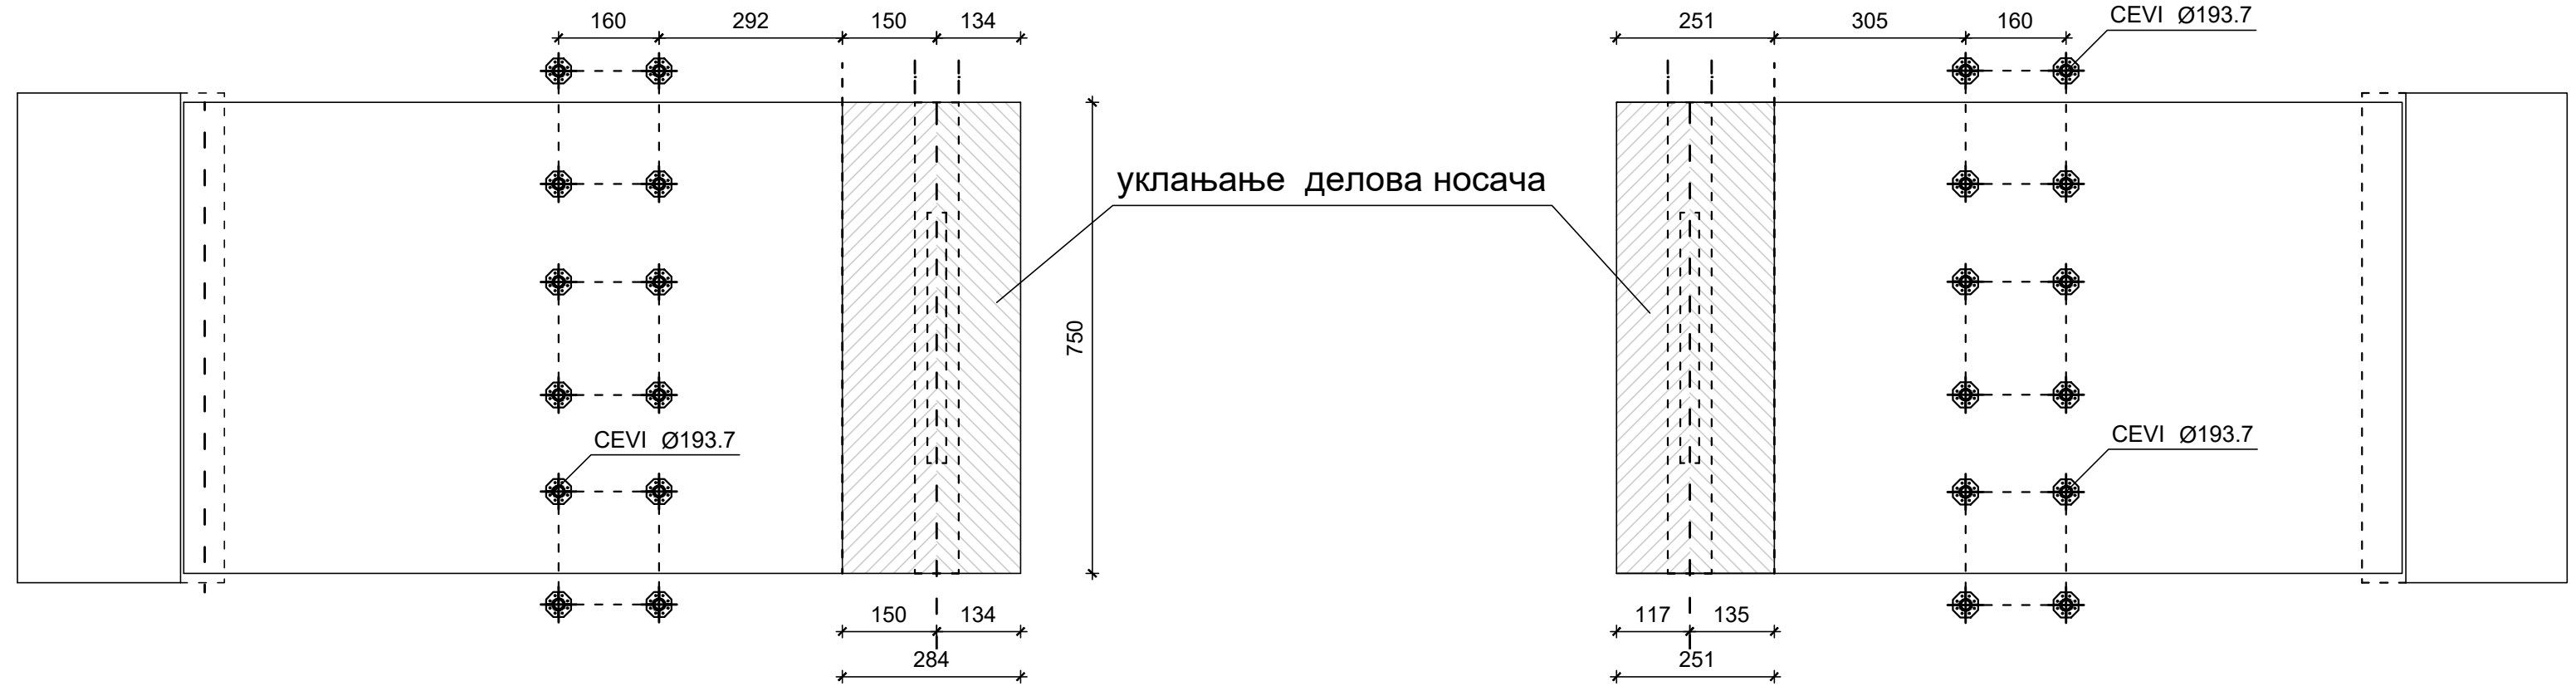


03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија		
Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Зоран Луковић, дипл. грађ. инж. лиценца број: / license No.: 310 3032 03	Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. / INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA "JSC Новапаца БИУ, Београд. / Nemanjina Street BIV, Beograd Наручилац пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd. No.10 Fuxing Road/Haidian District/Beijing P.R China, 100844 China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street/Xicheng District/Beijing P.R China, 100088	
Сарадници: / Associates:	Објекат: /Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА ПРУТЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКТА / DESIGN OF REMOVAL OBJECT 10/6 Пројекат рушења надвожњака на км 131+245.45 10/6 Demolition Design for Overpass at km 131+245.45	
Унутрашња контрола: / Internal control: Hou Jieping, Master & Shi Wei, Bachelor	Цртеж: / Drawing: ОСНОВА - ФАЗА III LAYOUT PLAN - PHASE III	Размера: Scale: 1:100
Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.	Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP	датум/date: 04.2021.
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.	Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-Г-С-10/6.7.03.	

ПОДУЖНИ ПРЕСЕК LONGITUDINAL SECTION 1:100
ФАЗА IV - Уклањање главних носача C1-C2 и C3-C4

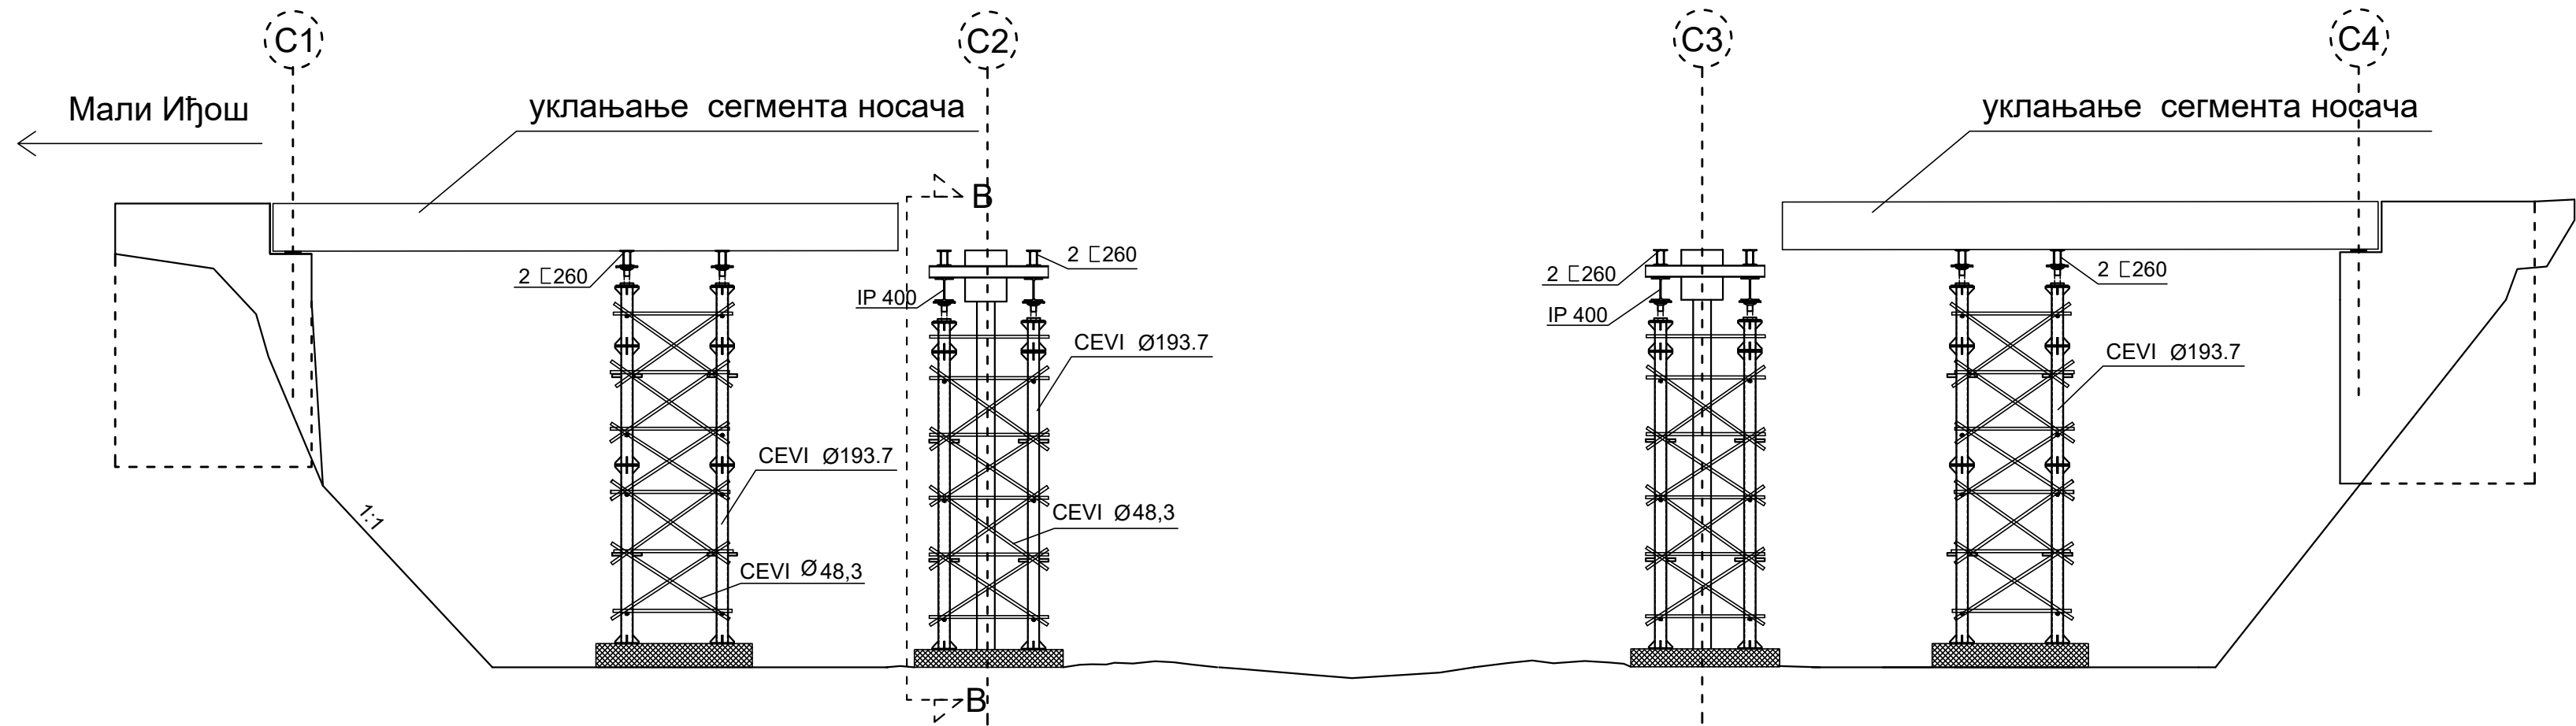


ОСНОВА НАДВОЖЊАКА 1:100 LAYOUT PLAN

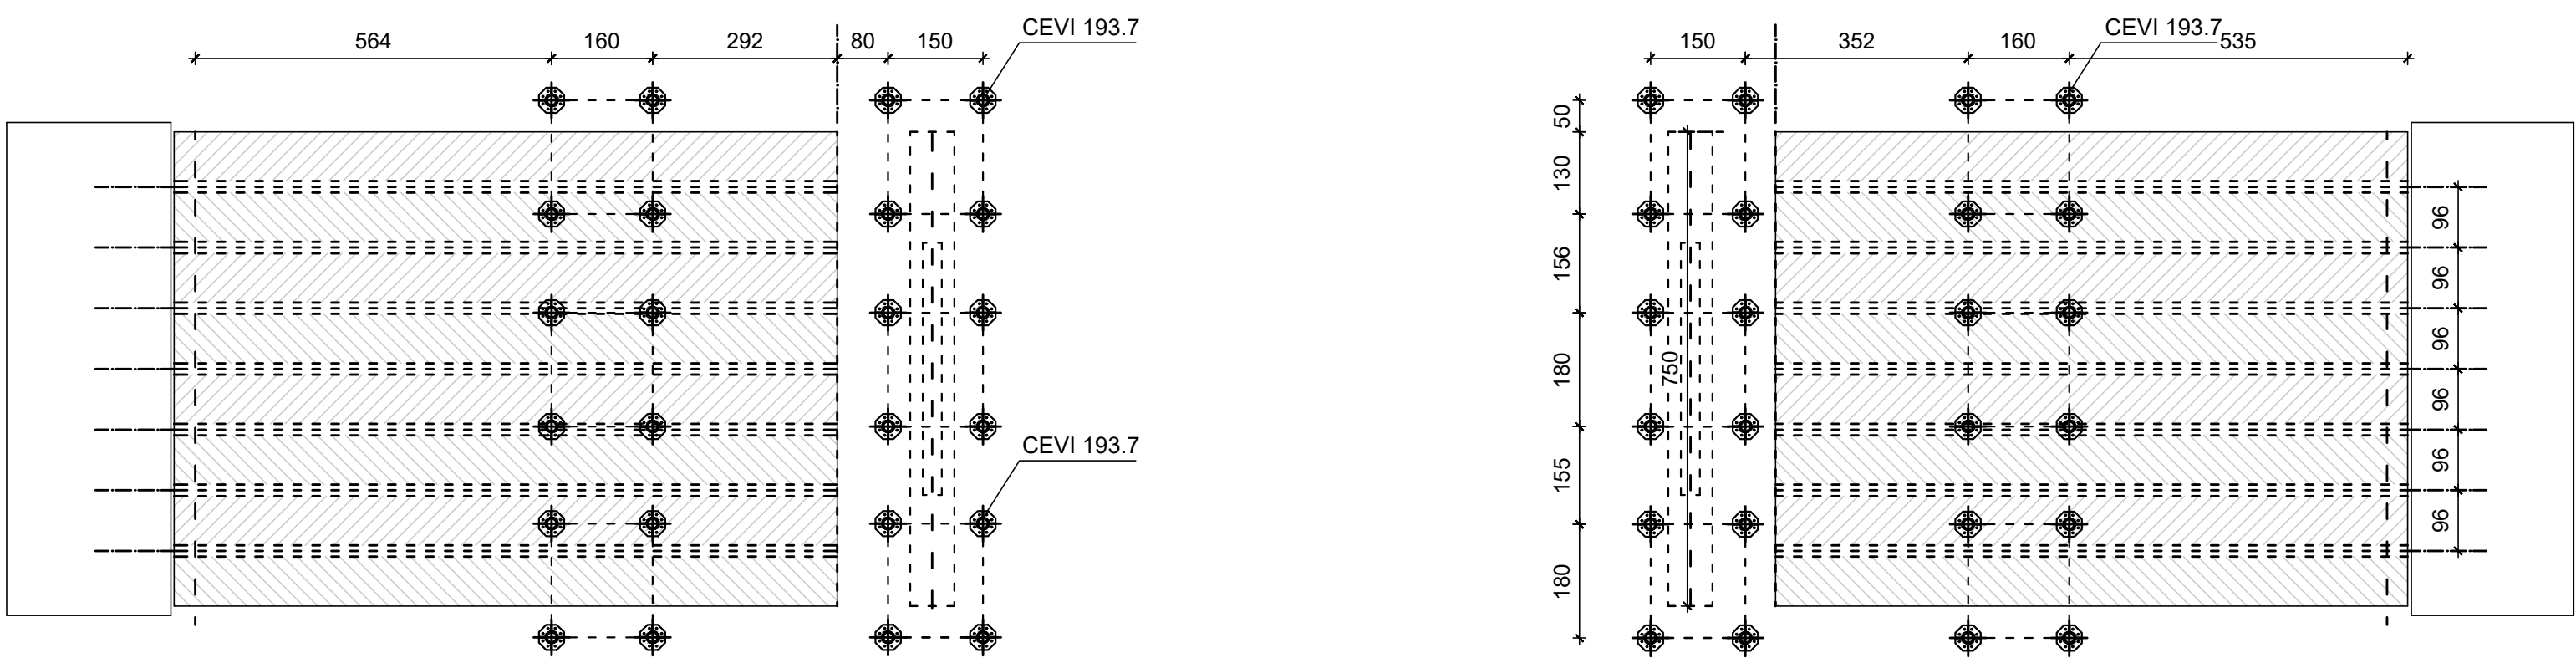

ПРЕСЕК В-В SECTION 1:100

ПРЕСЕК У ЗОНИ СТУБА C2

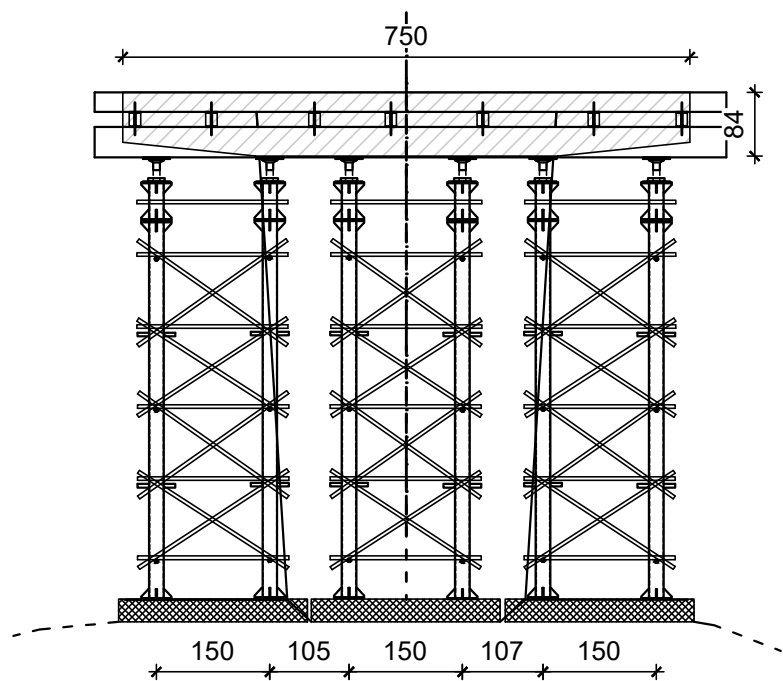

03		
02		
01		

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
-------------	--------------	--------------------

Ревизиони блок: / Revision block:


中国铁设 CRDC	China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија
----------------------------	---

Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION

Одговорни пројектант: Responsible designer: Зоран Луковић, дипл. грађ. инж. лиценца број: / license No.: 310 3032 03	Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. / "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Наручилац пројекта: / Employer: China Railway International Corporation Ltd. No.10 Fuxing Road/Haidian District/Beijing P.R.China, 100844 China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street/Xicheng District/Beijing P.R.China, 100088
Сарадници: / Associates:	Објекат: /Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА ПРУТЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКТА / DESIGN OF REMOVAL OBJECT 10/6 Пројекат рушења надвожњака на км 131+245.45 10/6 Demolition Design for Overpass at km 131+245.45
Унутрашња контрола: / Internal control: Hou Jieping, Master & Shi Wei, Bachelor	Цртеж: / Drawing: ОСНОВА - ФАЗА IV LAYOUT PLAN - PHASE IV
Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.	Размера: Scale: 1:100
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.	Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP
	датум/date: 04.2021.
	Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-Г-С-10/6.7.04.


ПОДУЖНИ ПРЕСЕК LONGITUDINAL SECTION 1:100

ФАЗА V - Уклањање лежишних греда и средњих стубова

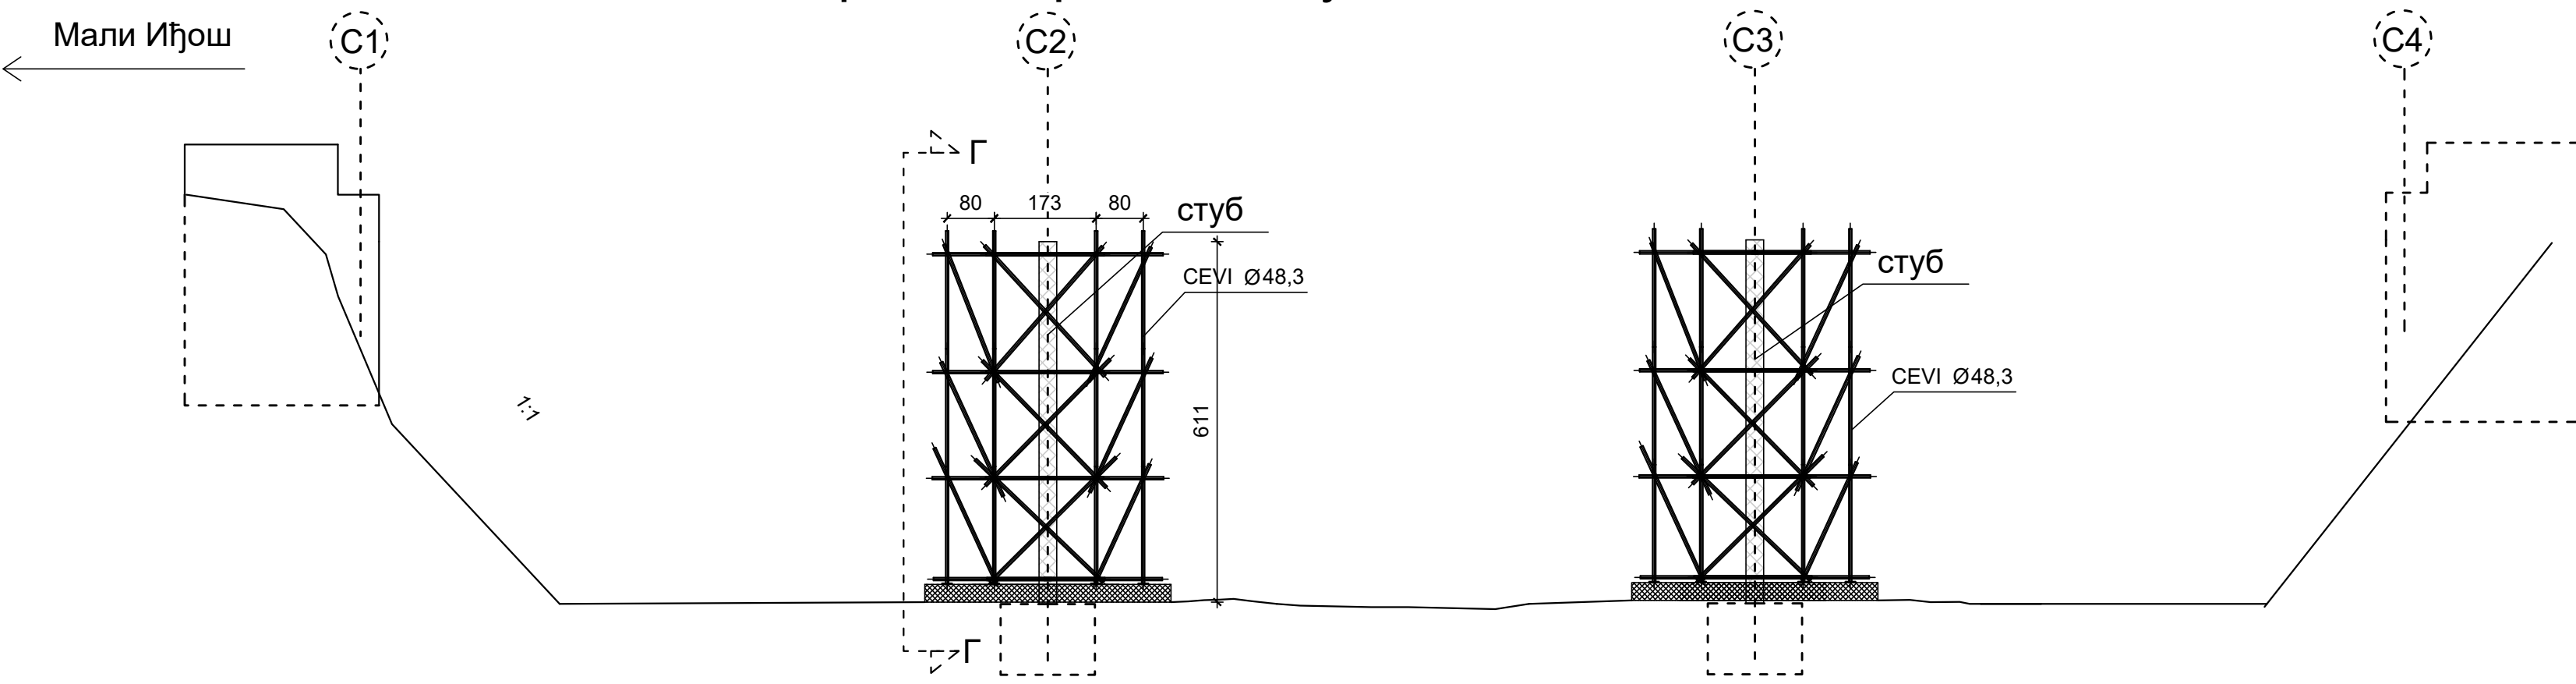


ПРЕСЕК Г-Г SECTION 1:100

ПРЕСЕК У ЗОНИ СТУБА С2

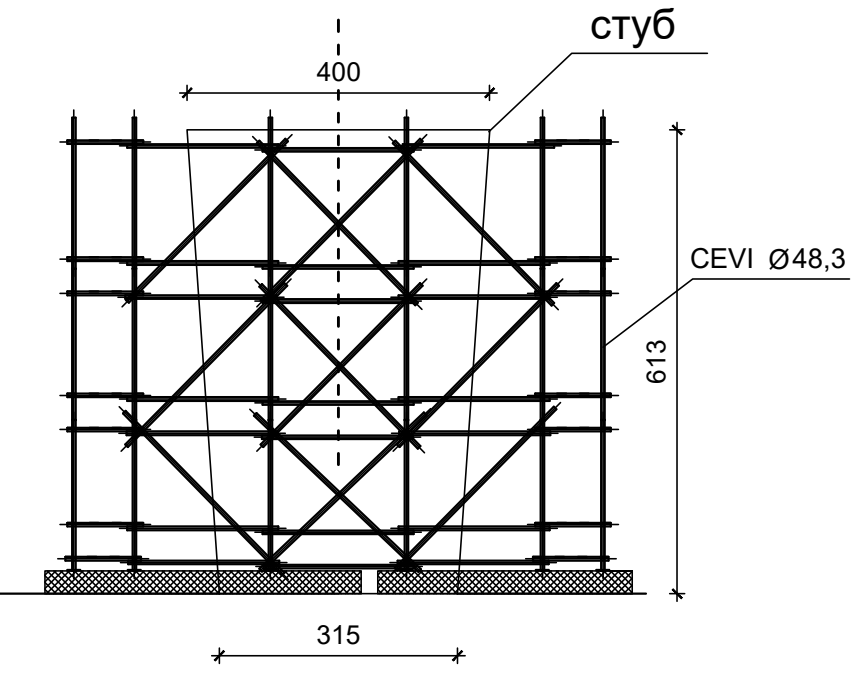


ОСНОВА НАДВОЖЊАКА 1:100 LAYOUT PLAN

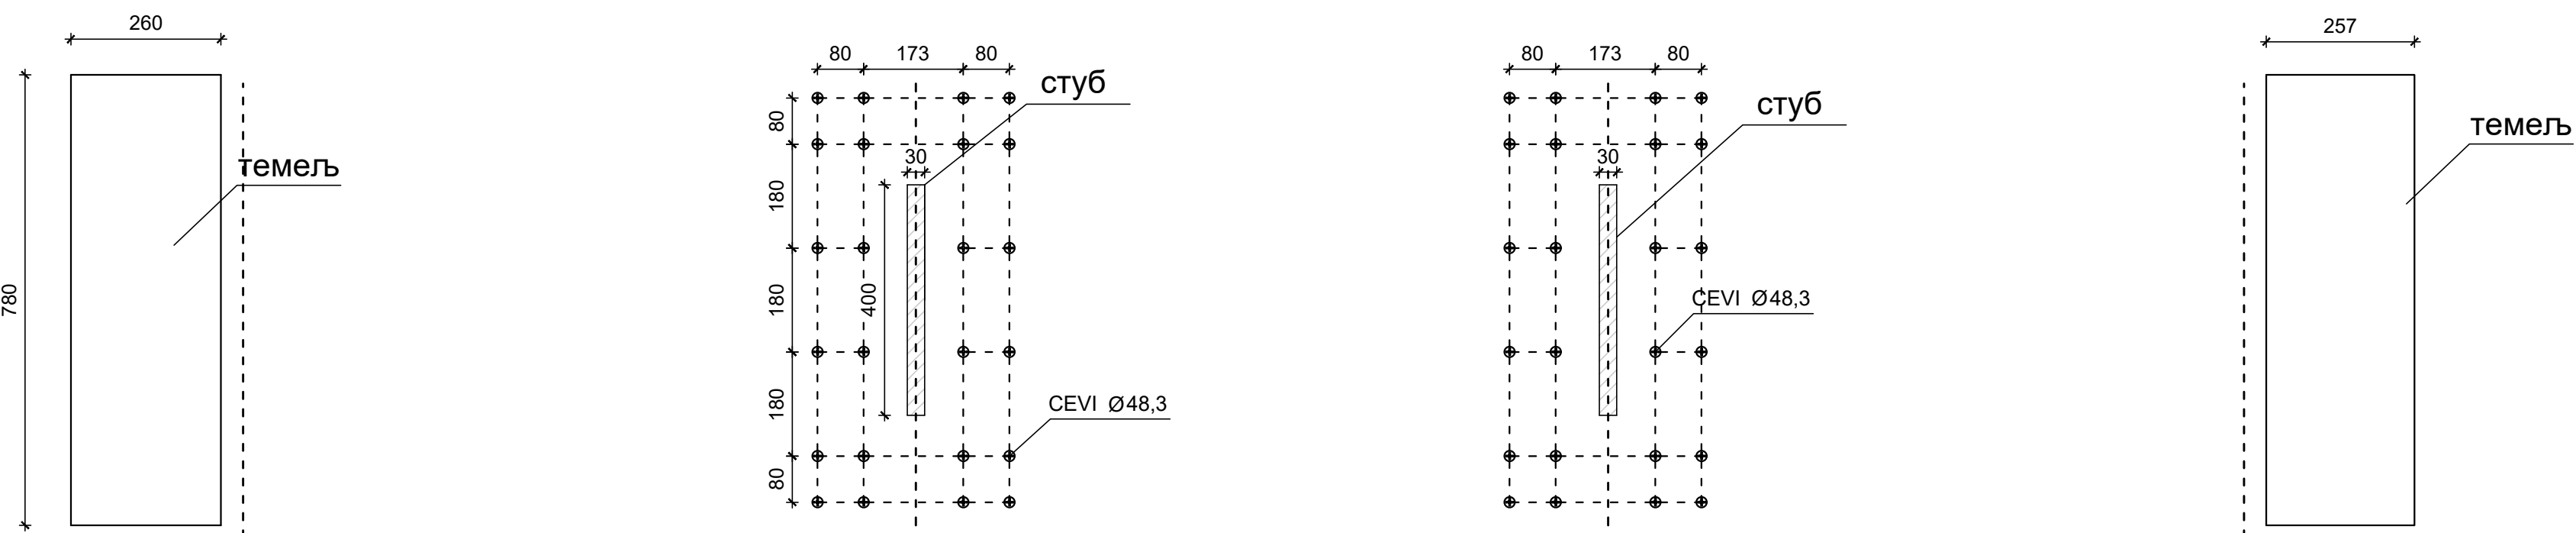

03		
02		
01		
Spoj/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија		
Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Зоран Луковић, дипл.грађ.инж лиценца број: / license No.: 310 3032 03	 Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. / INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC Немањина 61IV, Београд. / Nemanjina Street 61IV, Beigrade  Наручилац пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd. No.10 Fuxing Road/Haidian District/Beijing P.R.China, 100844  China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshangmenwai Street/Xicheng District/Beijing P.R.China, 100088	
Сарадници: / Associates:	Објекат: /Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА ПРУТЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКТА / DESIGN OF REMOVAL OBJECT 10/6 Пројекат рушења надвожњака на км 131+245.45 10/6 Demolition Design for Overpass at km 131+245.45	
Унутрашња контрола: / Internal control: Hou Jieping, Master & Shi Wei, Bachelor	 Цртеж: / Drawing: ОСНОВА - ФАЗА V LAYOUT PLAN - PHASE V Размера: Scale: 1:100	
Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	 Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP датум/date: 04.2021.	
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	 Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-Г-С-10/6.7.05.	

ПОДУЖНИ ПРЕСЕК LONGITUDINAL SECTION 1:100

ФАЗА VI - Рушење обалних стубова,наглавних греда и темеља

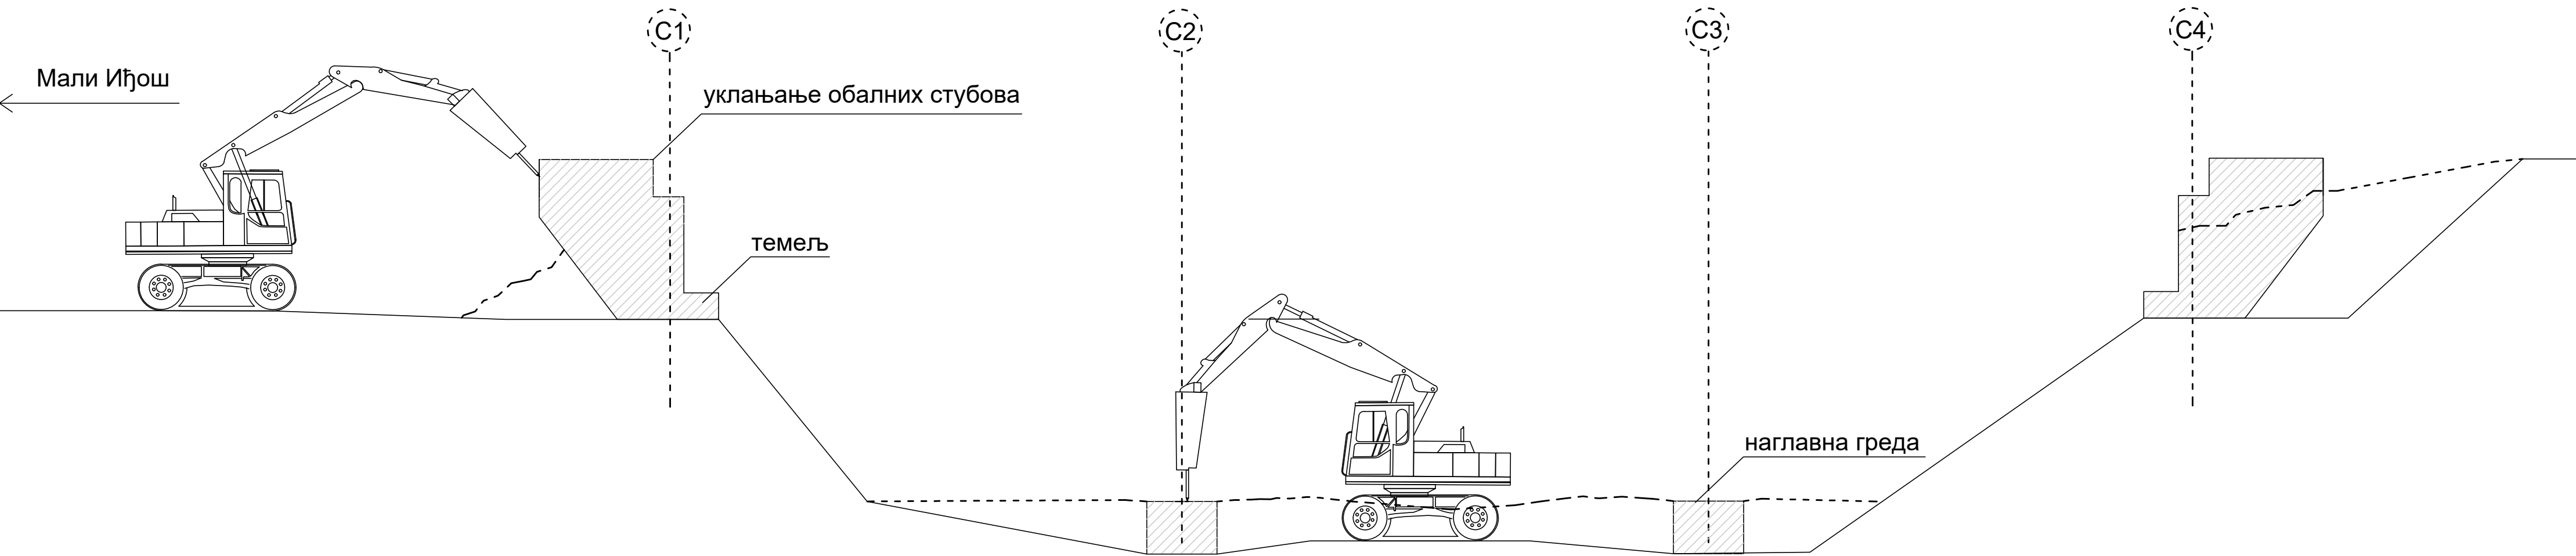

03		
02		
01		



Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
-------------	--------------	--------------------

Ревизиони блок: / Revision block:

**中国铁设**
CRDC

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION

Одговорни пројектант: Responsible designer: Зоран Луковић, дипл.грађ.инж лиценца број:/ license No.: 310 3032 03	Инвеститор пројекта: / Investor:  "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. / "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Наручилац пројекта: / Employer:  中国铁路国际有限公司 China Railway International Corporation Ltd. No.10 Fuxing Road/Haidian District,Beijing P.R.China, 100844  China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R.China, 100088
Сарадници: / Associates:	Објекат: /Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА ПРУТЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКТА / DESIGN OF REMOVAL OBJECT 10/6 Пројекат рушења надвожњака на км 131+245.45 10/6 Demolition Design for Overpass at km 131+245.45
Унутрашња контрола: / Internal control: Hou Jieping, Master & Shi Wei, Bachelor	Цртеж: / Drawing: ОСНОВА - ФАЗА VI LAYOUT PLAN - PHASE VI
Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Размера: Scale: 1:100
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP
	датум:/date: 04.2021.
	Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ГC-10/6.7.06.

10/6.8 ФОТО ДОКУМЕНТАЦИЈА

10/6.8 ФОТО ДОКУМЕНТАЦИЈА
НАДВОЖЊАК на стациономи км 131+245.45

Постојеће стање



Слика 1



Слика 2



Слика 3



Слика 4
